

Neugestaltung Travepromenade


Sachstand Januar 2022

Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" am 10. Januar 2022





Gestaltungslageplan Gesamtgebiet

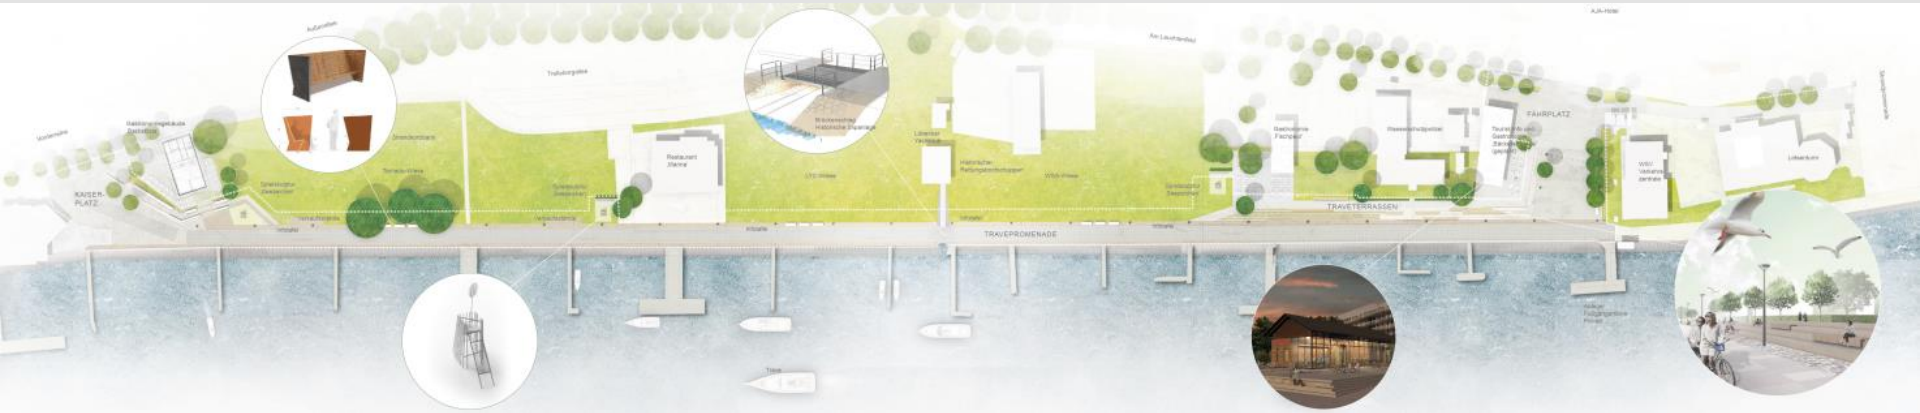




Eckpunkte

- ursprüngliche Kostenplanung lt. Förderantrag vom 20.12.2018: 3,8 Mio. € netto
- Fördersumme des Landes: 2,67 Mio. €
- Mehrkosten in Höhe von rd. 330.000 € sind entstanden für: Ergänzung Entwässerungseinrichtungen, Baumerhaltungsmaßnahmen, Baupreisanstieg, Wegfall von 50 % Vorsteuerabzug
- Bisher angefallene Kosten: 3,6 Mio. €
- In 2022 zu erledigende Restarbeiten: Einbau noch fehlender Möblierung, Ersatz nicht angewachsener Heckenpflanzen, Ausbesserung von Betonabplatzungen, Höhenangleich bei Terrasse MARINA, Fällung und Ersatzpflanzung von Bäumen
- Baubeginn Lückenschluss: Voraussichtlich Herbst 2022, Kosten T€ 500

Kleiner Fährplatz

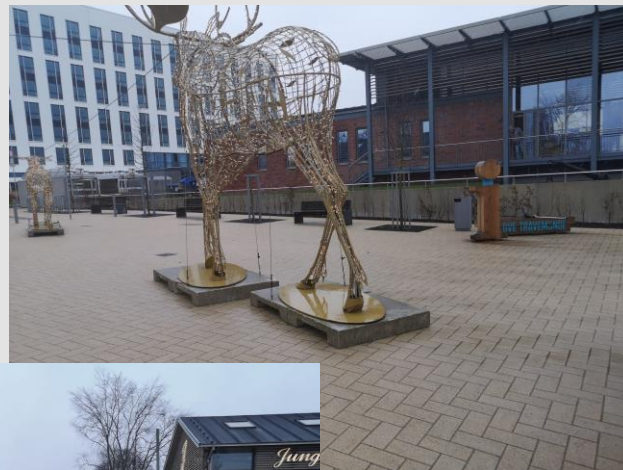



Promenade vom kleinen Fährplatz aus





Promenade Höhe Vorderreihe



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

